

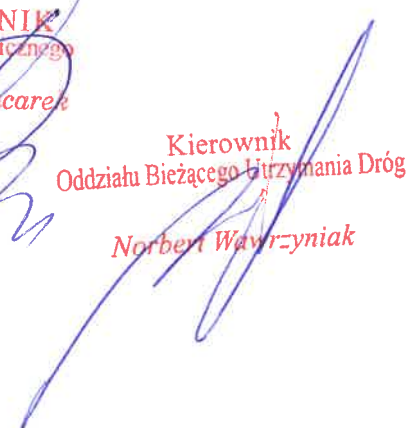
**Remonty wykonane na drogach powiatowych w 2024 roku
realizowane przez Wydział Dróg Powiatowych**

1. Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych.
 - 1) oznakowanie istniejących przejść dla pieszych na wszystkich drogach powiatowych: P-10 i P-14, łączna powierzchnia 1 829,975 m²
 - 2) oznakowanie drogi powiatowej nr 4487P od m. Przespolew Kościelny do m. Madalin (do ronda) na odcinku o długości ca 2,5 km: P-7c, P-4, P-1e, P-1b, P1a, na powierzchni 357,720 m²,
 - 3) oznakowanie drogi powiatowej nr 4604P i nr 4602P od m. Ceków do m. Przespolew Kościelny na odcinku o długości ca 8,3 km : P-7c, P-4, P-1e, P-1b, P1a, na powierzchni 1 008,780 m²,
 - 4) oznakowanie drogi powiatowej nr 5312P na odcinku od Krzemionki do ronda w Woli Droszewskiej na odcinku o długości ca 1,9 km: P-7a, P-7b, P-7c, P-10 i P-14, na powierzchni 523,245 m²
 - 5) oznakowanie drogi powiatowej nr 4628P w m. Opatówek od dr krajowej do granicy miasta na odcinku o długości ca 1,3 km: P-4, P-1e, P-1b, P1a, na powierzchni 146,920 m²,
 - 6) wykonanie nowych przejść dla pieszych w kolorze białym na drogach: nr 4621P w m. Staw, nr 4634P w m. Czempisz, nr 4609P w m. Koźminek, nr 4586P w m. Złotniki Wielkie: P-10, P-14, na powierzchni 55,625 m²,
 - 7) oznakowanie drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów od ronda w kierunku drogi woj. 450, przy utwardzonym poboczu na odcinku o długości ca 0,69 km: P-7a, P-7b, na powierzchni 161,640 m²,
 - 8) oznakowanie drogi powiatowej nr 4600P od m. Warszówka do m. Pruszków (do ronda) na odcinku o długości ca 2,5 km: P-4, P-1e, P-1b, P1a, na powierzchni 289,040 m²,
 - 9) oznakowanie drogi powiatowej nr 4601P i 4586P od drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Florentyna do m. Goliszew na odcinku o długości ca 7,5 km : P-7c, P-4, P-1e, P-1b, P1a, na powierzchni 943,320 m².
 - 10) łączna powierzchnia wykonanego oznakowania wyniosła 5 316,265 m²,
 - 11) wartość brutto robót: 89 999,44 zł
2. Zakup i wymiana znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (151 szt.)
 - 1) roboty związane z wymianą znaków wykonane przez pracowników Starostwa,
 - 2) wartość zakupu znaków drogowych: 32 403,81 zł,
 - 3) umowa w toku, do kwoty 85 000,00 zł.
3. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg powiatowych wykonane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kaliszu, przy użyciu masy na gorąco (185,20 t) i na zimno (30 t)
 - wartość zakupionego materiału: masa na gorąco 86 562,48 zł, masa na zimno 29 520,00 zł,
 - zakup w toku.
4. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów (powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe Patcherem):
 - 1) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej nr 5312P na odcinku Krzemionka – Wola Droszewska o długości 1900 m,
 - 2) podwójne powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej nr 4591P na odcinku Piątek Mały Kolonia - Garzew na długości 3400 m,
 - 3) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej nr 4327P w miejscowości Kokanin o długości 507 m,
 - 4) remonty cząstkowe Patcherem na drodze nr 4531P w miejscowości Sobiesęki Drugie 4,5 tony mieszanek,
 - 5) remonty cząstkowe (tzw. „łatki”) kombajnem do powierzchniowych utrwaleń na drodze nr 4594P na odcinku Morawin – Młynisko w ilości 2 228 m²,
 - 6) razem wartość brutto robót: 499 981,90 zł.

5. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej (remonty częściowe i wymiany konstrukcji nawierzchni bitumicznych):
- 1) wymiana konstrukcji jezdni na drodze powiatowej nr 4342P w miejscowości Długa Wieś Druga na łącznej powierzchni 409 m² – wartość robót 230 406,06 zł,
 - 2) wymiana konstrukcji jezdni na drodze powiatowej nr 4594P o wartości robót 250 074,01 zł, w miejscowościach:
 - a) Emilianów 22,4 m²
 - b) Krzyżówki 75 m²
 - c) Młynisko 306 m²
 - d) Morawin 22,5 m²,
 - 3) umowa w toku, wartość umowy 750 000,00 zł.
6. Remont drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe – ul. Ostrowska oraz nr 4621P w miejscowości Staw i Lipka w zakresie naprawy chodników
- 1) droga powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na powierzchni 258 m², obrzeży betonowych o dł. 215 m i regulacją krawężników,
 - 2) droga powiatowej nr 4621P w miejscowości Staw i Lipka - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na łącznej powierzchni 298 m² i obrzeży betonowych o dł. 234 m,
 - 3) łączna powierzchnia remontów: 556 m², wartość brutto robót: 86 570,97 zł.
7. Odtworzenie uszkodzonej bariery stalowej energochłonnej N2W3a w miejscowości Borków Stary na odcinku 240 mb:
- 1) demontaż bariery energochłonnej 240 m i 60 szt. słupków stalowych,
 - 2) montaż bariery pochodzącej z demontarzu 200 mb i 25 szt. słupków, montaż bariery nowej 40 mb i 35 szt. słupków nowych,
 - 3) wartość zadania 26 303,55 zł.
8. Odbudowa aktywnego solarnego oznakowania na przejściu dla pieszych na drodze nr 4628P w miejscowości Cienia Pierwsza. Montaż słupa z lampą solarną oraz znakiem D6 z lampą pulsacyjną fi 300. Wartość zadania 16 900,20 zł.
9. Budowa aktywnego solarnego oznakowania na przejściu dla pieszych na drodze nr 4634P w miejscowości Czempisz. Montaż dwóch słupów z lampami solarnymi oraz znakami D6 z lampami pulsacyjnymi fi 200. Wartość zadania 19 532,40 zł.

Kalisz, dnia 29 października 2024 roku


KIEROWNIK
Oddziału Technicznego
Robert Garncarek


Kierownik
Oddziału Bieżącego Utrzymania Dróg
Norbert Wawrzyniak


DYREKTOR
Wydziału Dróg Powiatowych
Paweł Kociok
